

Reporte financiero

Residencial Álamo · Etapa construcción

OGC - CONTROL DE OBRA

Periodo: 2026-01-01 a 2026-07-29

Documento automatizado. Las cifras provienen de cálculos deterministas; los comentarios de IA se validan contra las métricas del snapshot.

Gasto acumulado \$9,870,000	Avance físico 66.4%	Calidad de datos 82/100
---	---	---

Contenido autorizado

Resumen ejecutivo · Estado financiero · Valor ganado · Flujo y proyección · Variaciones · Requisiciones · Programa de obra · Bitácora · Calidad de datos

Resumen ejecutivo

Alertas deterministas e insights validados

El proyecto mantiene disponibilidad presupuestal, pero el CPI de 0.89 y el atraso físico frente al plan requieren priorizar rendimientos y actividades críticas. Las entregas vencidas elevan el riesgo operativo del siguiente periodo.

Fixture de revisión: los insights de IA no fueron solicitados.

Eficiencia de costo por debajo del umbral

HIGH

El valor producido es menor al costo incurrido.

Evidencia: earned_value.cpi: 0.89

Acción: Revisar rendimientos y precios unitarios de las partidas con mayor gasto.

Entregas vencidas

MEDIUM

Cuatro requisiciones excedieron la fecha comprometida.

Evidencia: requisitions.overdue_deliveries: 4

Acción: Confirmar fechas y priorizar materiales vinculados con la ruta crítica.

Estado financiero

Presupuesto original



\$12,800,000

Presupuesto aprobado



\$13,250,000

Gasto del periodo



\$1,420,000

Saldo



\$3,380,000

Ejercido



74.5%

Flujo neto del periodo



-\$320,000

Ingresos acumulados



\$10,900,000

Pagos pendientes



\$870,000

Compromisos aprobados




\$1,240,000

■ Valor ganado

Indicadores calculados con el presupuesto aprobado

PV ■ \$9,646,000 Valor planeado	EV ■ \$8,798,000 Valor ganado	AC ■ \$9,870,000 Costo real
CPI ■ 0.89 EV / AC	SPI ■ 0.91 EV / PV	EAC ■ \$14,887,640
ETC ■ \$5,017,640	Variación al cierre ■ -\$1,637,640	Físico / planeado ■ 66.4% / 72.8%

■ Curva de gasto real contra proyección

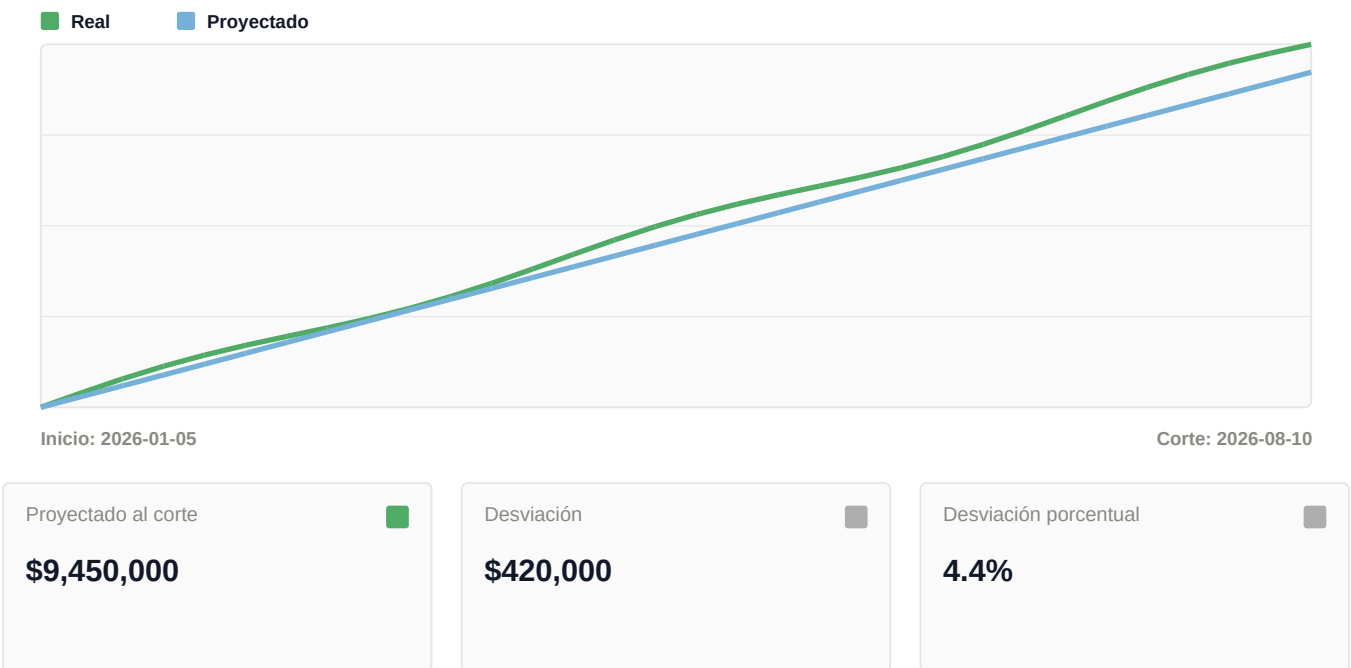

■ Partidas con mayor desviación

Partida	Aprobado	Costo	Saldo	Ejercido
Partida 01 · Instalación y suministro especial	\$850,000	\$640,000	\$210,000	75.0%
Partida 02 · Instalación y suministro especial	\$838,000	\$633,500	\$204,500	75.4%
Partida 03 · Instalación y suministro especial	\$826,000	\$627,000	\$199,000	75.8%
Partida 04 · Instalación y suministro especial	\$814,000	\$620,500	\$193,500	76.2%
Partida 05 · Instalación y suministro especial	\$802,000	\$614,000	\$188,000	76.6%
Partida 06 · Instalación y suministro especial	\$790,000	\$607,500	\$182,500	77.0%
Partida 07 · Instalación y suministro especial	\$778,000	\$601,000	\$177,000	77.4%
Partida 08 · Instalación y suministro especial	\$766,000	\$594,500	\$171,500	77.8%
Partida 09 · Instalación y suministro especial	\$754,000	\$588,000	\$166,000	78.2%
Partida 10 · Instalación y suministro especial	\$742,000	\$581,500	\$160,500	78.6%
Partida 11 · Instalación y suministro especial	\$730,000	\$575,000	\$155,000	79.0%
Partida 12 · Instalación y suministro especial	\$718,000	\$568,500	\$149,500	79.4%
Partida 13 · Instalación y suministro especial	\$706,000	\$562,000	\$144,000	79.8%
Partida 14 · Instalación y suministro especial	\$694,000	\$555,500	\$138,500	80.2%
Partida 15 · Instalación y suministro especial	\$682,000	\$549,000	\$133,000	80.6%
Partida 16 · Instalación y suministro especial	\$670,000	\$542,500	\$127,500	81.0%
Partida 17 · Instalación y suministro especial	\$658,000	\$536,000	\$122,000	81.4%
Partida 18 · Instalación y suministro especial	\$646,000	\$529,500	\$116,500	81.8%
Partida 19 · Instalación y suministro especial	\$634,000	\$523,000	\$111,000	82.2%
Partida 20 · Instalación y suministro especial	\$622,000	\$516,500	\$105,500	82.6%
Partida 21 · Instalación y suministro especial	\$610,000	\$510,000	\$100,000	83.0%
Partida 22 · Instalación y suministro especial	\$598,000	\$503,500	\$94,500	83.4%
Partida 23 · Instalación y suministro especial	\$586,000	\$497,000	\$89,000	83.8%
Partida 24 · Instalación y suministro especial	\$574,000	\$490,500	\$83,500	84.2%
Partida 25 · Instalación y suministro especial	\$562,000	\$484,000	\$78,000	84.6%
Partida 26 · Instalación y suministro especial	\$550,000	\$477,500	\$72,500	85.0%
Partida 27 · Instalación y suministro especial	\$538,000	\$471,000	\$67,000	85.4%
Partida 28 · Instalación y suministro especial	\$526,000	\$464,500	\$61,500	85.8%

Las cinco partidas de mayor gasto concentran 52.7% del gasto acumulado.

■ Requisiciones

Total 47	Por revisar 6	Por pagar 9
Por entregar 11	Entregas vencidas 4	Monto comprometido \$1,240,000

■ Programa de obra

Actividades 86	Atrasadas 12	Avance físico 66.4%
Avance planeado 72.8%		

■ Bitácora

Entradas del periodo



41

Incidencias



5

- Retraso en el suministro de tubería hidráulica para los niveles superiores.
- La lluvia impidió el colado programado; se reprogramó la cuadrilla.
- Se detectó interferencia entre instalaciones eléctricas y plafón.
- Se requiere liberar el frente norte antes de recibir acabados.
- La inspección de seguridad solicitó señalización adicional.

■ Calidad de datos y metodología

Indicador	Registros	Detalle
invalid_dates	2	Hay registros con fechas inválidas o rangos invertidos.
incomplete_weights	1	La ponderación del programa suma 97.50%, no 100%.
mixed_currencies	2	Se detectaron múltiples monedas; no se aplicó conversión automática.

- Los importes se calculan de forma determinista desde los registros del proyecto.
- PV y EV usan el presupuesto aprobado multiplicado por el avance planeado y físico.
- $CPI = EV / AC$; $SPI = EV / PV$; $EAC = \text{presupuesto aprobado} / CPI$.
- La IA sólo explica métricas existentes y no recalcula cantidades.
