

Larena Torre G

Obra activa

Periodo del 28 jul 2026 al 03 ago 2026

Presupuesto aprobado

\$105,225,001

Gasto total

\$74,539,332

Por ejercer


\$30,685,669

RESUMEN EJECUTIVO

Esta semana el proyecto avanzó en los frentes de Acabados, Instalaciones y Albañilerías. El avance físico real se ubica en 68% frente a 72% planeado, con un CPI de 0.96. Se reportó una incidencia de seguridad y cuatro entregas vencidas que requieren seguimiento.


PROGRAMA DE OBRA

10 actividades atrasadas

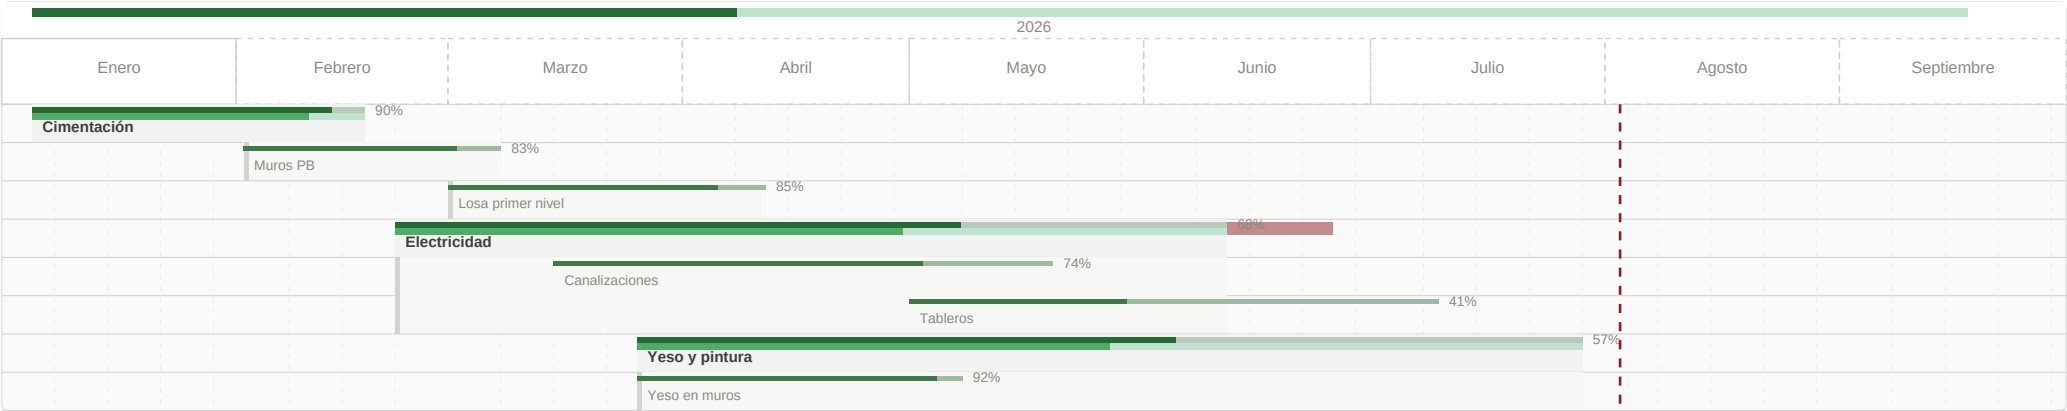

PROGRAMA DE OBRA

16 actividades · corte 03 ago 2026

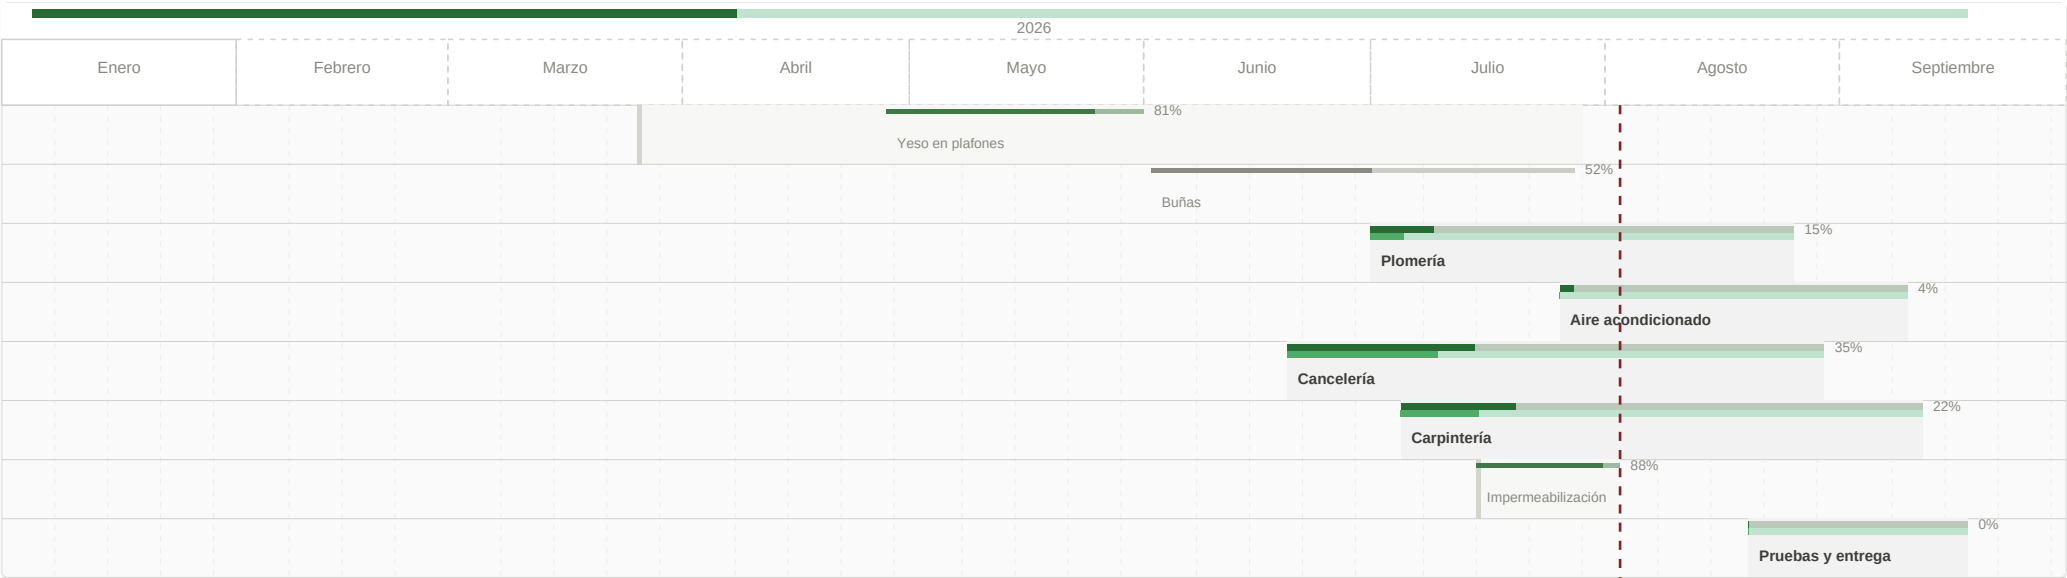

Avance físico real

68%

Valor ganado (EV)

\$71.6M

Costo real acum. (AC)

\$74.5M

CPI

0.96

EAC (Costo al cierre)

\$109.6M

FUERZA DE TRABAJO SEMANAL

Captura del periodo

Personal en obra

14

Oficiales albañiles

3

Oficial carpintero

2

Oficial herrero

2


Ayudantes

7

Gasto Mano de Obra

Total


\$4.2M

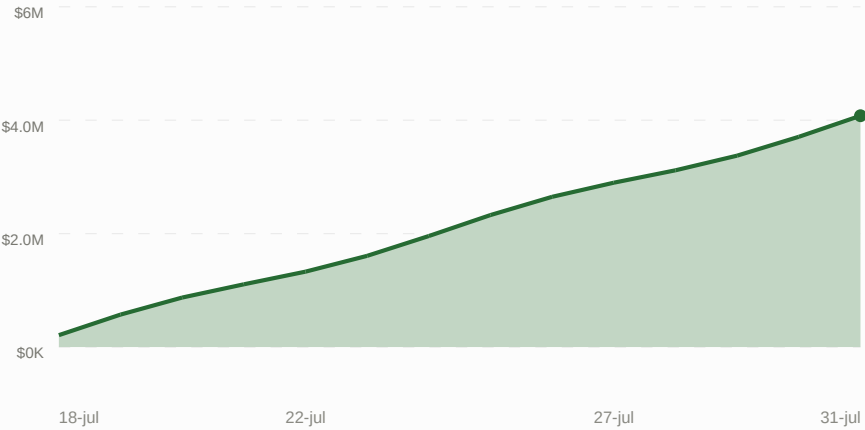

Fuerza de trabajo semanal

Total

14

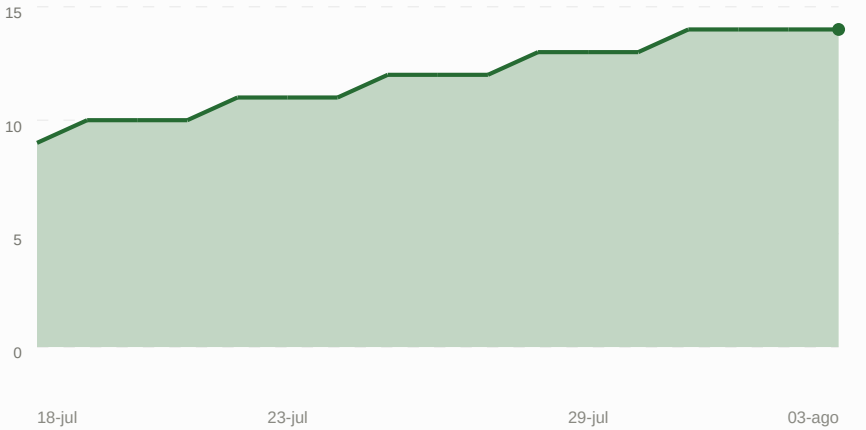

FLUJO Y PROYECCIÓN

Ingreso del periodo

\$3.9M

Gasto del periodo

\$4.4M

Flujo neto

-\$520K

Pagos pendientes

\$2.9M

Compromisos

\$4.2M

TOP 5 PARTIDAS CON MAYOR VARIANZA

Rojo: excedente de pago · Verde: ahorro o monto pendiente por ejercer

Partida	Presupuesto	Pagado	Varianza	Avance
MÁRMOL	\$6,452,000	\$6,958,492	-\$506,492	65%
CANCELERÍA	\$5,452,000	\$5,777,000	-\$325,000	35%
YESO Y PINTURA	\$4,452,000	\$4,300,000	\$152,000	45%
CARPINTERÍA	\$3,452,000	\$3,572,500	-\$120,500	22%
AIRE ACONDICIONADO	\$7,452,000	\$7,572,500	-\$120,500	4%

El avance proviene del Programa de Obra; no se infiere a partir del porcentaje ejercido del presupuesto.



Albañilerías

28 jul 2026 - 03 ago 2026 · Sergio Sánchez

- Resane de oquedades para recibir impermeabilizante; frente dominante de la semana.
- Fijación de lavadero y backsplash en lavanderías.
- Aplicación de estuco a pretilos y arranque de cuarto de bombas.
- Cierre de semana: aplicación de sellopack y registros pluviales y sanitarios.



COMENTARIOS (1)

Resane de oquedades para recibir impermeabilizante



COMENTARIOS (1)

Preparación del frente de acabados



COMENTARIOS (1)

Aplicación de sellopack para evitar filtraciones

Instalaciones

28 jul 2026 - 03 ago 2026 · Luis Contreras

- Resane de oquedades para recibir impermeabilizante; frente dominante de la semana.
- Fijación de lavadero y backsplash en lavanderías.
- Aplicación de estuco a pretilos y arranque de cuarto de bombas.
- Cierre de semana: aplicación de sellopack y registros pluviales y sanitarios.



COMENTARIOS (1)

Resane de oquedades para recibir impermeabilizante



COMENTARIOS (1)

Preparación del frente de acabados



COMENTARIOS (1)

Aplicación de sellopack para evitar filtraciones

Acabados

28 jul 2026 - 03 ago 2026 · Sergio Sánchez

- Resane de oquedades para recibir impermeabilizante; frente dominante de la semana.
- Fijación de lavadero y backsplash en lavanderías.
- Aplicación de estuco a pretilos y arranque de cuarto de bombas.
- Cierre de semana: aplicación de sellopack y registros pluviales y sanitarios.



COMENTARIOS (1)

Resane de oquedades para recibir impermeabilizante



COMENTARIOS (1)

Preparación del frente de acabados



COMENTARIOS (1)

Aplicación de sellopack para evitar filtraciones

Seguridad

28 jul 2026 - 03 ago 2026 · Luis Contreras

- Resane de oquedades para recibir impermeabilizante; frente dominante de la semana.
- Fijación de lavadero y backsplash en lavanderías.
- Aplicación de estuco a pretilos y arranque de cuarto de bombas.

Incidencia reportada: Se solicitó reforzar el cumplimiento de medidas de seguridad en el frente norte.



COMENTARIOS (1)

Resane de oquedades para recibir impermeabilizante



COMENTARIOS (1)

Preparación del frente de acabados



COMENTARIOS (1)

Aplicación de sellopack para evitar filtraciones

INSIGHTS Y ACCIONES RECOMENDADAS


Eficiencia de costo por debajo del umbral
El valor producido es menor al costo incurrido.

Acción: Revisar rendimientos y precios unitarios de las partidas con mayor gasto.

Entregas vencidas
Cuatro requisiciones excedieron la fecha comprometida.

Acción: Confirmar fechas y priorizar materiales vinculados con la ruta crítica.

REQUISICIONES



CALIDAD DE DATOS Y METODOLOGÍA

Calidad 96/100

incomplete_weights	La ponderación del programa suma 99.50%; revisar la familia de acabados.	1
- Los importes se calculan de forma determinista desde los registros del proyecto. - El avance de la tabla de variaciones proviene del Programa de Obra. - PV y EV usan el presupuesto aprobado multiplicado por el avance planeado y físico. - La IA sólo explica métricas existentes y no recalcula cantidades.		

